

R6付替道路工事(その3)
R7. 1月～R7. 12月
進捗率: 完成 ③

R6付替道路工事(その6)
R7. 3月～R8. 1月
進捗率: 完成 ④

R6付替道路工事(その2)
R7. 3月～R8. 2月
進捗率: 約96% ②

鳥羽河内ダム本体工事
R5. 10月～R10. 4月
進捗率: 約39% ①

R7放流設備工事(その2)
R7. 8月～R9. 3月
進捗率: 約7% ⑩

R6放流設備工事
R6. 8月～R8. 8月
進捗率: 約71% ⑨



進捗状況は下記サイトでも紹介しています！

県土整備部
YouTube

河川課 X

河川課
Instagram

フォロー＆チャンネル登録よろしくお願いたします！

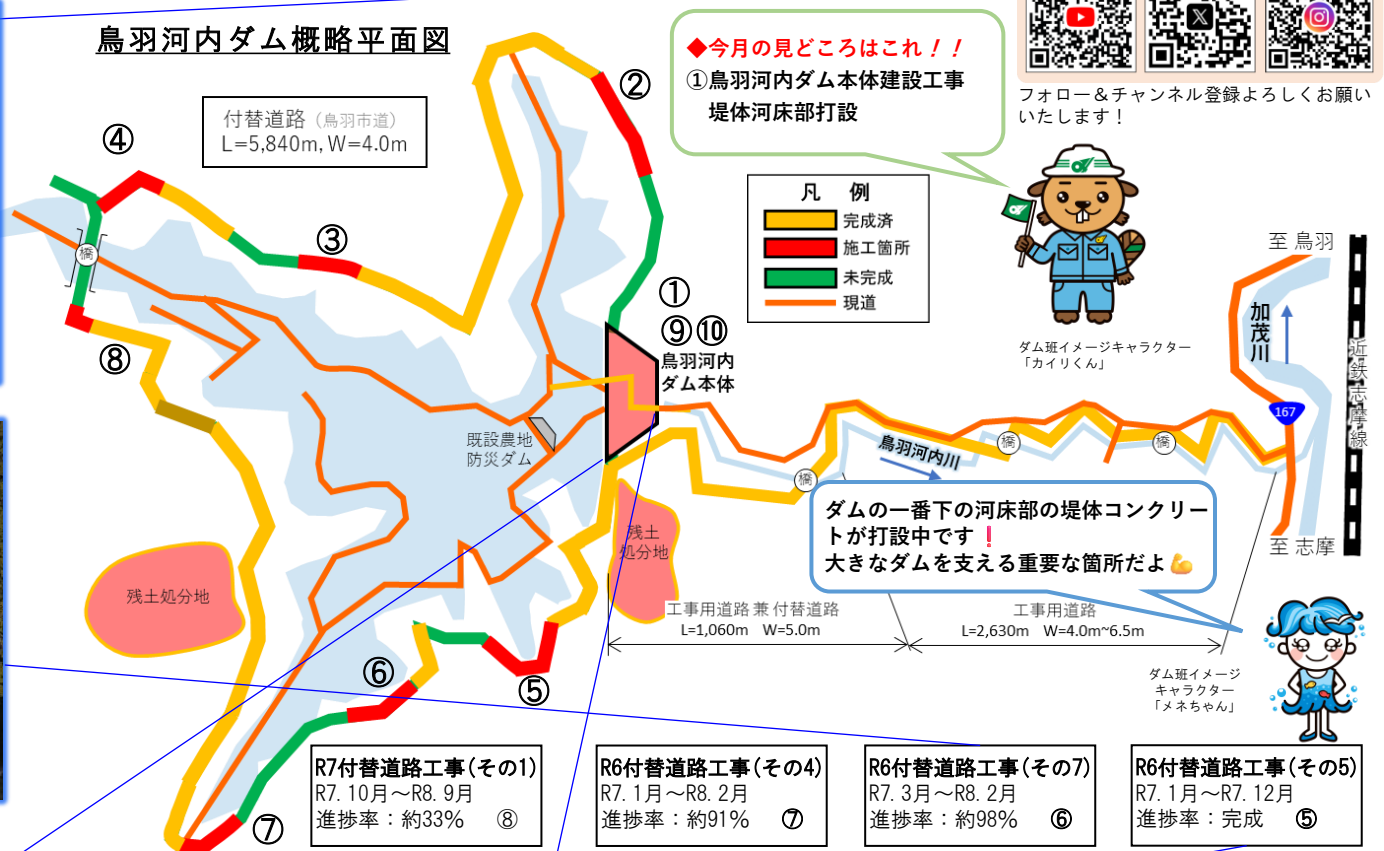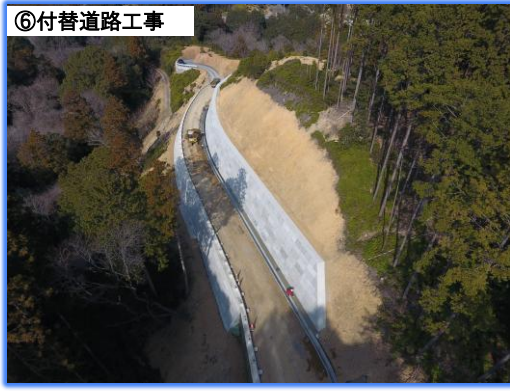

令和6年9月30日



令和7年3月31日



次回 令和8年3月末状況を掲載予定！

令和7年11月30日



令和8年1月31日

