

R7付替道路工事(その1)
R7. 10月～R8. 9月
進捗率: 約84% ②

R7付替道路工事(その3)
R8. 1月～R8. 11月
進捗率: 約51% ④

R7付替道路工事(その2)
R8. 3月～R9. 1月
進捗率: 約6% ③

鳥羽河内ダム本体工事
R5. 10月～R10. 4月
進捗率: 約49% ①

R7放流設備工事(その2)
R7. 8月～R9. 3月
進捗率: 約20% ⑩

R6放流設備工事
R6. 8月～R8. 8月
進捗率: 約94% ⑨

進捗状況は下記サイトでも紹介しています！



フォロー＆チャンネル登録よろしくお願いたします！




ダム班イメージキャラクター「カイルくん」



ダム班イメージキャラクター「メネちゃん」

鳥羽河内ダム概略平面図

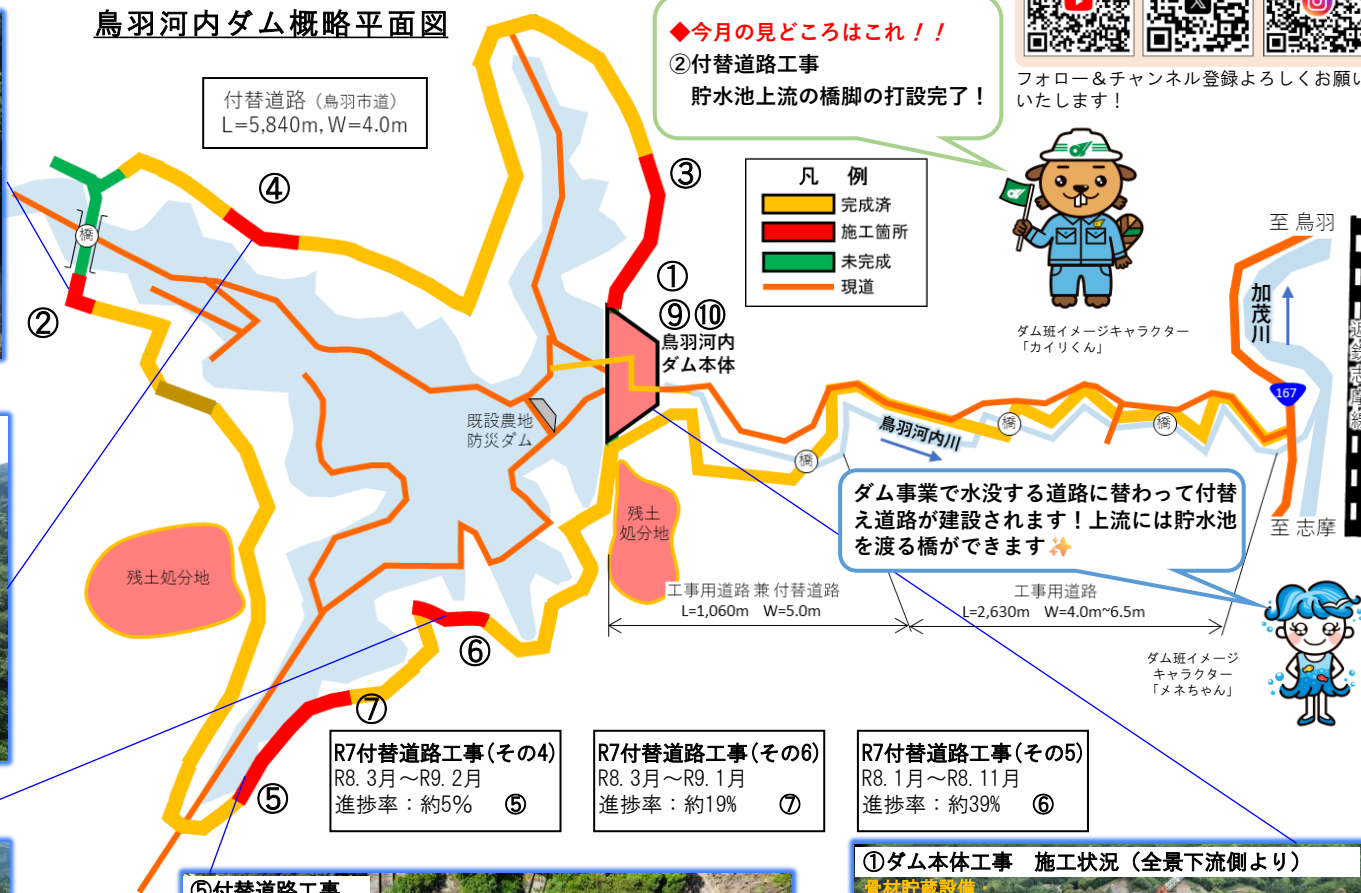

R7付替道路工事(その4)
R8. 3月～R9. 2月
進捗率: 約5% ⑤

R7付替道路工事(その6)
R8. 3月～R9. 1月
進捗率: 約19% ⑦

R7付替道路工事(その5)
R8. 1月～R8. 11月
進捗率: 約39% ⑥



②付替道路工事



④付替道路工事



⑥付替道路工事



⑤付替道路工事



①ダム本体工事 施工状況 (全景下流側より)

骨材貯蔵設備
コンクリート製造設備

ダム本体設備場所

鳥羽河内川

令和6年9月30日




令和7年7月31日



次回 令和8年7月末状況を掲載予定！

令和8年3月31日

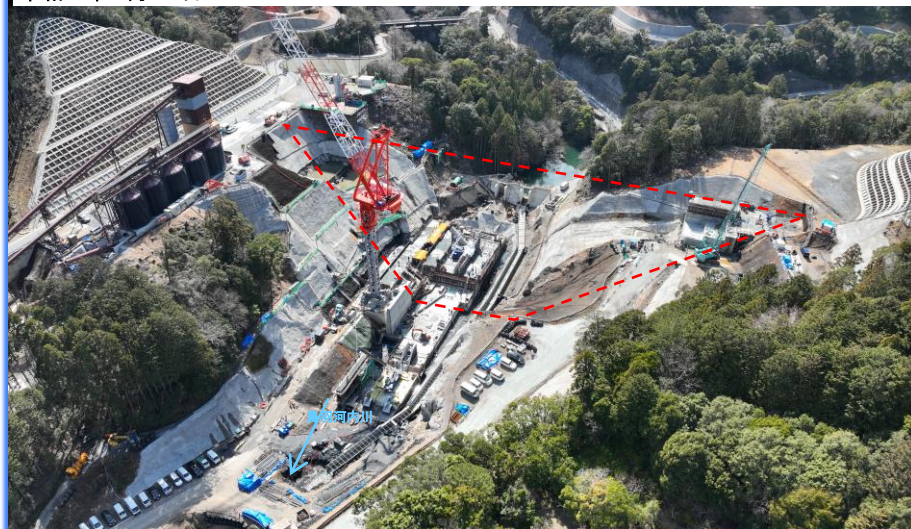

令和8年5月31日

